



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione DPCM 1/6/2014



**PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE
“ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO”
(FESR 2007-2013)**

**ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA CHIUSURA DEL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI**

Maggio 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione DPCM 1/6/2014



PREMESSA

Con il presente documento l'Autorità di Gestione del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (FESR) 2007 – 2013 (di seguito POIn o Programma), a complemento delle "Linee guida sulla chiusura delle operazioni rivolte ai Beneficiari" trasmesse ai Beneficiari del Programma (rif. note prot. SMAPT nn. 371 e 372 del 26/04/2016) e pubblicate sul sito web www.poinattrattori.it, intende fornire ai medesimi specifiche istruzioni tecnico - operative a supporto della corretta chiusura del monitoraggio delle operazioni nel sistema informativo del POIn, SGP - Sistema Gestione Progetti, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale responsabile della gestione di tale sistema.

Tali istruzioni riguardano le modalità di aggiornamento e/o di consolidamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario registrati nel sistema per ciascuna operazione, sia che si tratti di un'operazione conclusa entro il 31/12/2015, sia che, entro tale termine, ne sia stata completata una prima fase ovvero realizzata una parte delle attività (e la seconda fase ovvero le attività residue saranno completate, rispettivamente, con risorse della programmazione comunitaria 2014 – 2020 ovvero con risorse nazionali).

Riguardo a questo secondo caso e, in particolare, ai grandi progetti ed ai progetti di importo pari o superiore a 5 Meuro suddivisi in fasi, si forniscono le prime istruzioni volte ad agevolare la transizione del monitoraggio in SGP dalla prima fase a valere sul POIn alla seconda fase a valere sullo strumento della Programmazione comunitaria 2014 – 2020 in cui questa è stata inserita.

Nel corso della chiusura, saranno fornite ulteriori istruzioni per la chiusura del monitoraggio nel POIn di tali casi specifici, in collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione responsabile dello strumento di attuazione in cui la seconda fase ovvero la parte residua di attività del progetto da completare è stata inserita.

1. ISTRUZIONI OPERATIVE

In linea generale, è necessario assicurare entro il termine di chiusura, per tutte le operazioni del POIn, sia quelle concluse entro il 31/12/2015, sia quelle da completare secondo le casistiche previste dagli *Orientamenti sulla chiusura dei Programmi operativi 2007 – 2013*, che il sistema di monitoraggio SGP sia implementato in maniera esaustiva e puntuale in tutte le sue sezioni.

A tal fine si forniscono le istruzioni per la corretta chiusura del monitoraggio delle operazioni, in particolare, nelle sezioni del sistema di seguito riportate.

- Sezione Finanziaria – Tab Piano costi

E' necessario che il "Costo totale" sia ripartito sulle diverse annualità e che siano inseriti tutti i pagamenti effettuati, verificando che il "Totale Costo Realizzato", quale somma dei pagamenti effettuati fino al 31/12/2015, sia pari al "Totale Importi" dei pagamenti effettuati fino al 31/12/2015 nel "Tab Pagamenti" della sezione finanziaria.



Sistema Gestione Progetti
Agenzia per la Coesione Territoriale
Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013
UNA PA PER LA CRESCITA

Stampa Lista Torna all'elenco Logout Help ?

Versioni Progetto
Anagrafica dei Progetti
Sezione Finanziaria
Sezione Fisica-Indicatori
Sezione Procedurale
Soggetti Correlati
Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Finanziamenti **Piano costi** Quadro Economico Economie Impegni Pagamenti

Totale Costo: **15.000.000,00** Totale Costo Da Realizzare: **8.699.125,10** Totale Costo Realizzato: **6.300.874,90**
Trovati 3 elementi pagina 1 di 1

Anno	Costo totale	Costo da realizzare	Costo realizzato
2014	525.699,75	0,00	525.699,75
2015	3.775.175,15	0,00	3.775.175,15
2016	8.699.125,10	8.699.125,10	0,00

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> [Vai]

Costo realizzato* [?] Anno* 2017 [?]
Costo da realizzare* [?] Costo totale [?]

Generale
Novità
Anagrafiche
Strumenti Attuativi
Progetti
Ricerca Progetti
Ricerca Versioni Progetto
Scarico Dati
Gestione Spese

Salva Pagamento | Stampa Lista | Gest. Allegati | Torna all'elenco | Logout | Help | ?

Finanziamenti | Piano costi | Quadro Economico | Economie | Impegni | **Pagamenti**

Codice: ? Importo: ?
Data: ? Causale: ?

Cerca Annulla

Totale Importi: **6.300.874,90** Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **6.300.874,90**
Trovati 36 elementi

Code	Data	Tipo	Importo	di cui ammesso UE	di cui ammesso FAS/FSC/PAC/ARN	Note
AFF842302023	17/12/2015	Pagamento	70.850,88	70.850,88		
AFF842301885	17/12/2015	Pagamento	15.587,36	15.587,36		
AFF842272023	14/12/2015	Pagamento	653.929,70	653.929,70		
AFF842271885	14/12/2015	Pagamento	143.864,53	143.864,53		
AFF842261885	05/12/2015	Pagamento	73.158,49	73.158,49		
AFF842262023	05/12/2015	Pagamento	546.937,52	546.937,52		
AFF842251885	04/11/2015	Pagamento	138.176,52	138.176,52		
AFF842252023	04/11/2015	Pagamento	628.075,10	628.075,10		

pagina 1 di 5

- *Sezione Finanziaria – Tab Quadro Economico*

Per i progetti conclusi entro il 31/12/2015 ovvero per la prima fase o le attività realizzate entro tale data nel caso dei progetti che saranno completati successivamente (suddivisi in fasi, non funzionanti, ecc.), è necessario aggiornare le categorie di spesa (“Tipo”) del “Quadro economico”, modificandone lo stato da “Prevista” ad “Effettiva”.

Sistema Gestione Progetti | Agenzia per la Coesione Territoriale | PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 | UNA PA PER LA CRESCITA

Torna all'elenco | Logout | Help | ?

Finanziamenti | Piano costi | **Quadro Economico** | Economie | Impegni | Pagamenti

Totale Importi: **15.000.000,00**
Trovati 6 elementi

Tipo	Importo	Stato
7 - Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	140.000,00	Prevista
9 - Lavori realizzati in affidamento	8.655.276,10	Prevista
10 - Lavori realizzati in economia	740.000,00	Prevista
13 - IVA	1.421.745,44	Prevista
98 - Altro	4.042.978,40	Prevista
98 - Altro	0,06	Prevista

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> | Vai



Sistema Gestione Progetti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013
UNA PA PER LA CRESCITA

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria**
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità

Torna all'elenco Logout Help ?

Finanziamenti Piano costi **Quadro Economico** Economie Impegni Pagamenti

Totale Importi: **46.438.812,24**

Trovati 4 elementi

Tipo	Importo	Stato
1 - Progettazione e studi	2.321.938,67	Effettiva
2 - Suolo aziendale	245.206,34	Effettiva
3 - Opere murarie	32.657.739,50	Effettiva
4 - Macchinari impianti, attrezzature e altre forniture	11.213.927,73	Effettiva

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> Val

- **Sezione Fisica – Indicatori – Tab Indicatori**

E' necessario che, per le operazioni concluse entro il 31/12/2015 ovvero per la prima fase o le attività realizzate entro tale data nel caso dei progetti che saranno completati successivamente (suddivisi in fasi, non funzionanti, ecc.), il Beneficiario garantisca, entro e non oltre la sessione di monitoraggio del 30 giugno 2016:

a) l'aggiornamento del valore relativo agli indicatori occupazionali e di realizzazione fisica che SGP associa *di default* all'operazione. Al riguardo, si precisa che, tra tali indicatori, il Beneficiario dovrà selezionare e valorizzare quelli pertinenti all'operazione;

Finanziaria
Sezione Fisica-Indicatori
Sezione Procedurale
Soggetti Correlati
Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale
Novità
Anagrafiche
Strumenti Attuativi
Progetti
Ricerca Progetti
Ricerca Versioni Progetto
Scarico Dati
Gestione Spese
Gestione Rendicontazione
Protocolli Esterni
Procedure Attivazione
Controlli e Irregolarità
Decertificazioni
Recuperi

Indicat. Dett. Form.

Trovati 5 elementi pagina 1 di 1

Descrizione	Tipo Indicatore	Codice Indicatore	Misura	Obbligatorio	Valore iniziale	Valore attuale	Valore raggiunto
Superficie oggetto di intervento (mq)	Indicatore di realizzazione fisica	791	mq	SI	10.610,000	10.610,000	0,000
Riduzione nei consumi energetici	Indicatore di realizzazione fisica	804	TEP	SI	0,000		
Superficie oggetto di intervento (Ha)	Indicatore di realizzazione fisica	803	Ha	SI	0,000		
Giornate/uomo attivate fase di cantiere	Indicatore Occupazionale	689	N	SI	0,000		
Giornate/uomo complessivamente attivate	Indicatore Occupazionale	682	N	SI	0,000		

Selezionare prima il Tipo Obiettivo e aggiornare
Tipo Indicatore: Indicatore Realiz. Fisica [aggiorna ?]

Indicatore* 791 - Superficie oggetto di intervento (mq) [?]

Misura* mq [?] Destinatarî : No

Valore iniziale* 10.610,000 [?] **Valore attuale** 10.610,000 **Valore raggiunto** 0,000 [?]

Valore Concluso 0,000 [?] **Valore Baseline** 0,000 [?]

b) la selezione, nell'ambito dell'elenco degli "Indicatori di Programma" - che coincidono con gli indicatori di realizzazione previsti nell'ultima versione approvata del POIn¹ - di quelli associati all'Asse/Obiettivo operativo di riferimento dell'operazione.

Ricerca Versioni Progetto
Scarico Dati
Gestione Spese
Gestione Rendicontazione
Protocolli Esterni
Procedure Attivazione
Controlli e Irregolarità
Decertificazioni
Recuperi

Selezionare prima il Tipo Obiettivo e aggiornare
Tipo Indicatore: [] [aggiorna ?]

Indicatore* [] [?]
Indicatore di Programma
Indicatore Opzionale
Indicatore Realiz. Fisica
Indicatore Realiz. Occupazionale

Misura* [] [?]

Valore iniziale* [] [?] **Valore attuale** [] **Valore raggiunto** [] [?]

Valore Concluso [] [?] **Valore Baseline** [] [?]

¹ Approvata con Decisione C(2015)9292 - 15/12/2015) e disponibile sul sito internet www.poinattrattori.it

- **Sezione procedurale – Tab Iter proc.**

E' necessario aggiornare le date delle fasi procedurali secondo l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione. Si raccomanda, in particolare, di aggiornarne le date relative alle fasi con inizio e/o fine prevista entro il 31/12/2015 e non avviate e/o concluse entro tale data.



Sistema Gestione Progetti
Agenzia per la Coesione Territoriale
Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013
UNA PA PER LA CRESCITA

Versioni Progetto
Anagrafica dei Progetti
Sezione Finanziaria
Sezione Fisica-Indicatori
Sezione Procedurale
Soggetti Correlati
Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale
Novità
Anagrafiche
Strumenti Attuativi
Progetti
Ricerca Progetti
Ricerca Versioni Progetto
Scarico Dati

Torna all'elenco Logout Help ?

Iter proc. Altre Attiv. SAL Sosp. Rev./Rin. Linee di Attività

Data monitoraggio VS: 28/02/2016 ?

Trovati 8 elementi pagina 1 di 1

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione OOPP - Studio di fattibilità	Conclusa			03/05/2012	27/06/2012
Realizzazione OOPP - Progettazione Preliminare	Conclusa			03/05/2013	27/06/2013
Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	Conclusa			03/05/2013	27/06/2013
Realizzazione OOPP - Progettazione Esecutiva	Conclusa			03/05/2013	27/06/2013
Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori	In corso	30/06/2014	30/12/2015	26/05/2014	
Realizzazione OOPP - Collaudo	Da avviare	30/12/2015	31/12/2015		
Realizzazione OOPP - Chiusura Intervento	Da avviare	31/12/2015	31/12/2015		
Realizzazione OOPP - Funzionalità	Da avviare	31/12/2015	31/12/2015		

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> Vai

- **Sezione “Procedure di aggiudicazione e piano di committenza”**

E' necessario aggiornare la sezione per ciascuna procedura di affidamento, secondo le seguenti modalità operative:

- inserire il CIG, selezionare il tipo di procedura adottata e compilarne la descrizione;
- dopo il salvataggio, il sistema visualizzerà in basso a sinistra il Tab “Iter Procedurale Gare”, all’interno del quale sarà possibile inserire le informazioni di dettaglio;

Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale**
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione

Torna all'elenco Logout Help ?

Proc.Ag. / Piano Comm.

Trovati 1 elementi pagina 1 di 1

CIG	Importo	Percentuale
	8.073.074,71	26.85

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> Vai

CIG/Codice Procedura* [?]

Tipo procedura* **Procedura Aperta** [?]

Descrizione* [?]

Importo 8.073.074,71 [?]

Note [?]

Percentuale di Ribasso 26,85 [?]

Iter Procedurale Gare [?]

Agg. o Comm. Procedura di Aggiudicazione [?]

c. inserire, per ciascuna fase della procedura di gara, almeno le date (sia prevista, sia effettiva) e l'importo comprensivo di IVA.

Sezione Finanziaria

Sezione Fisica-Indicatori

Sezione Procedurale

Soggetti Correlati

Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e

Proc.Ag. / Piano Comm.

Trovati 5 elementi pagina 1 di 1

Codice	Descrizione	Data Prevista	Data Effettiva
101	Pubblicazione Bando	18/09/2013	18/09/2013
102	Acquisizione Offerte	12/11/2013	12/11/2013
103	Aggiudicazione Provvisoria	22/01/2014	22/01/2014
104	Aggiudicazione Definitiva	22/02/2014	22/04/2014
105	Stipula Contratto	23/01/2014	23/01/2014

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> Vai

Codice 101 [?]

Descrizione Pubblicazione Bando [?]

Data Prevista 18/09/2013 [?]

Data Effettiva 18/09/2013 [?]

Soggetto Competente [?]

Motivo Scostamento [?]

Importo comprensivo IVA 8.073.074,71 [?]

Note GUCE [?]

Per inciso, il dato relativo alla percentuale di ribasso dovrà essere inserito nella schermata della fase “Aggiudicazione definitiva”.

Finanziaria

- Sezione Fisica-Indicatori
- Sezione Procedurale**
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità

Proc.Aggr./Piano Comm.

Trovati 5 elementi pagina 1 di 1

Codice	Descrizione	Data Prevista	Data Effettiva
101	Pubblicazione Bando	18/09/2013	18/09/2013
102	Acquisizione Offerte	12/11/2013	12/11/2013
103	Aggiudicazione Provvisoria	22/01/2014	22/01/2014
104	Aggiudicazione Definitiva	22/02/2014	22/04/2014
105	Stipula Contratto	23/01/2014	23/01/2014

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> [Vai]

Codice 104 ?

Descrizione Aggiudicazione Definitiva ?

Data Prevista 22/02/2014 ?

Data Effettiva 22/04/2014 ?

Motivo Scostamento Problemi Amministrativi ?

Percentuale di Ribasso * 26,85 ?

Importo comprensivo IVA 8.073.074,71 ?

Soggetto Competente ?


Note ?

2. PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DEI GRANDI PROGETTI E DEI PROGETTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MEURO SUDDIVISI IN FASI.

Al fine di agevolare la transizione del monitoraggio dei progetti in esame dalla prima fase attuata nell'ambito del POIn alla seconda fase che sarà attuata a valere sulla programmazione 2014-2020, il Beneficiario dovrà assicurare, entro la sessione di monitoraggio del 30 giugno 2016, l'implementazione delle Sezione Finanziaria secondo le modalità di seguito specificate:

- Sezione Finanziaria - Tab Pagamenti:

1. Dovranno essere visualizzati SOLO i pagamenti "Ammessi UE" che risultano quietanzati entro la data del 31/12/2015.

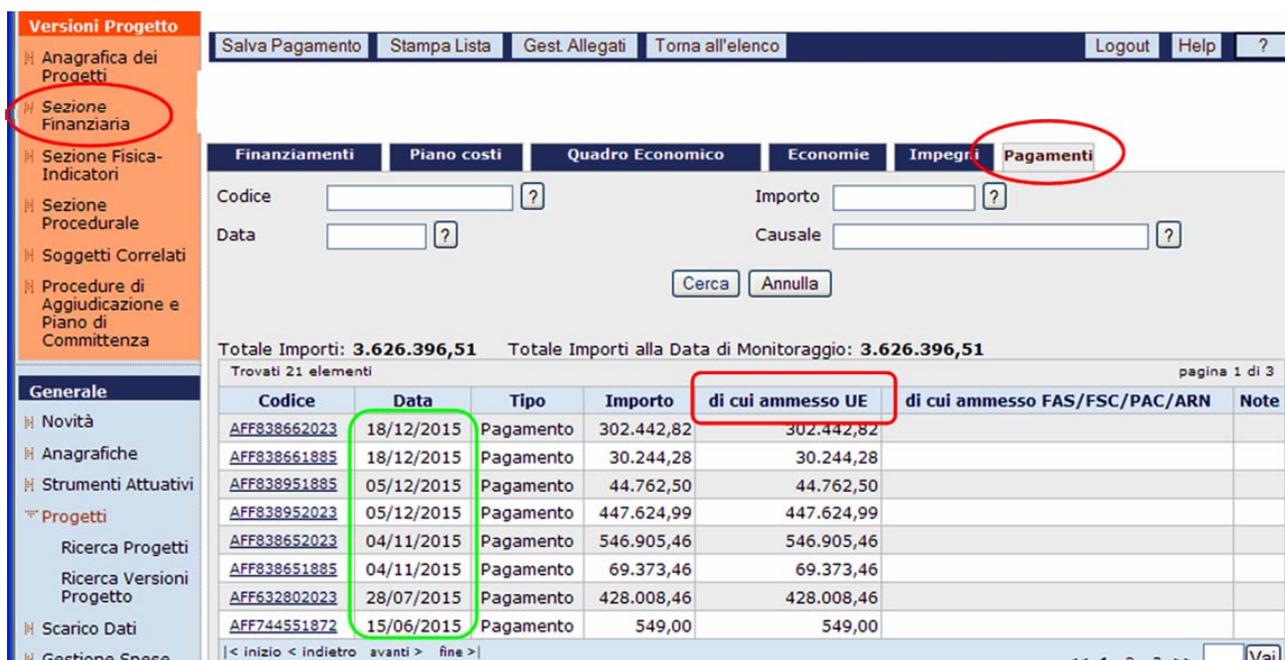

Codice	Data	Tipo	Importo	di cui ammesso UE	di cui ammesso FAS/FSC/PAC/ARN	Note
AFF838662023	18/12/2015	Pagamento	302.442,82	302.442,82		
AFF838661885	18/12/2015	Pagamento	30.244,28	30.244,28		
AFF838951885	05/12/2015	Pagamento	44.762,50	44.762,50		
AFF838952023	05/12/2015	Pagamento	447.624,99	447.624,99		
AFF838652023	04/11/2015	Pagamento	546.905,46	546.905,46		
AFF838651885	04/11/2015	Pagamento	69.373,46	69.373,46		
AFF632802023	28/07/2015	Pagamento	428.008,46	428.008,46		
AFF744551872	15/06/2015	Pagamento	549,00	549,00		

Qualora nel sistema fossero stati inseriti pagamenti effettuati dopo tale data, il Beneficiario dovrà procedere, nella sezione "Gestioni spese – Richieste di pagamento", alla riapertura delle relative richieste quietanzate.

Strumenti Attuativi

- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Scarico Dati
- Gestione Spese**
- Affidamenti
- Documenti di Spesa
- Richieste Pagamento**
- Riepilogo Contabile
- Gestione Rendicontazione
- Protocolli Esterni
- Procedure Attivazione
- Controlli e Irregolarità
- Decertificazioni
- Recuperi

Anagrafica **Dettaglio Pagamento**

TOTALI:
 Importo Importo Ammissibile Importo Calcolato

Data Elaborazione* ? Numero Richiesta ?
 Sistema Pagamento* ? Tipi Fondo ?
 Tipo Richiesta ? Fondo* ?
 Tipo Pagamento ?
 Annullato ?

Note

Chiusura Richiesta

Data Protocollo/Invio ? Numero Protocollo ?
 Data Repertorio ? Numero Repertorio ?

Sistema Gestione Progetti - Windows Internet Explorer

http://dpsapp.dps.gov.it/SGP/ponatas/protected/findAllRichPagamenti.do?showDetailRichPagamento=OK&id=5

Sistema Gestione Progetti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013
UNA PA PER LA CRESCITA

Generale

- Novità
- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti

Nuova Richiesta | Aggiorna Anagrafica Chiusa | **Riapri Richiesta Chiusa** | Torna all'elenco | Logout | Help | ?

Anagrafica

Anagrafica | Dettaglio Pagamento | Quietanze | Colloquio NSF | Allega file NSF


TOTALI:

2. Sarà possibile CHIUDERE le richieste relative ai pagamenti effettuati dopo il 31/12/2015 solo a partire dalla versione di monitoraggio del 30/08/2016, in occasione della quale la competenza per il monitoraggio del progetto sarà trasferita dall'AdG del POIn al soggetto responsabile dello strumento della programmazione comunitaria 2014 – 2020 nell'ambito del quale ne sarà attuata la seconda fase.

3. PRIME ISTRUZIONI PER I PROGETTI NON FUNZIONANTI E PER PROGETTI NON DICHIARABILI COME NON FUNZIONANTI E NON SUDDIVISIBILI IN FASI

Per i progetti in esame che saranno completati con risorse nazionali entro il 31/03/2017 (progetti di importo inferiore a 5 Meuro, non dichiarabili come non funzionanti e non suddivisibili in fasi) ovvero entro il 31/03/2019 (progetti non funzionanti), si raccomanda ai Beneficiari di prestare massima attenzione a non imputare i pagamenti quietanzati a partire dal 01/01/2016 nella colonna “di cui ammesso UE” della sezione Finanziaria – Tab Pagamenti.

Si potrà provvedere all'aggiornamento dei dati imputando direttamente dal TAB “Pagamenti/Nuovo Pagamento” l'importo quietanzato dopo il 31/12/2015 senza replicarlo in NESSUNA altra colonna, bensì inserendolo soltanto nella cella/colonna “Importo”.

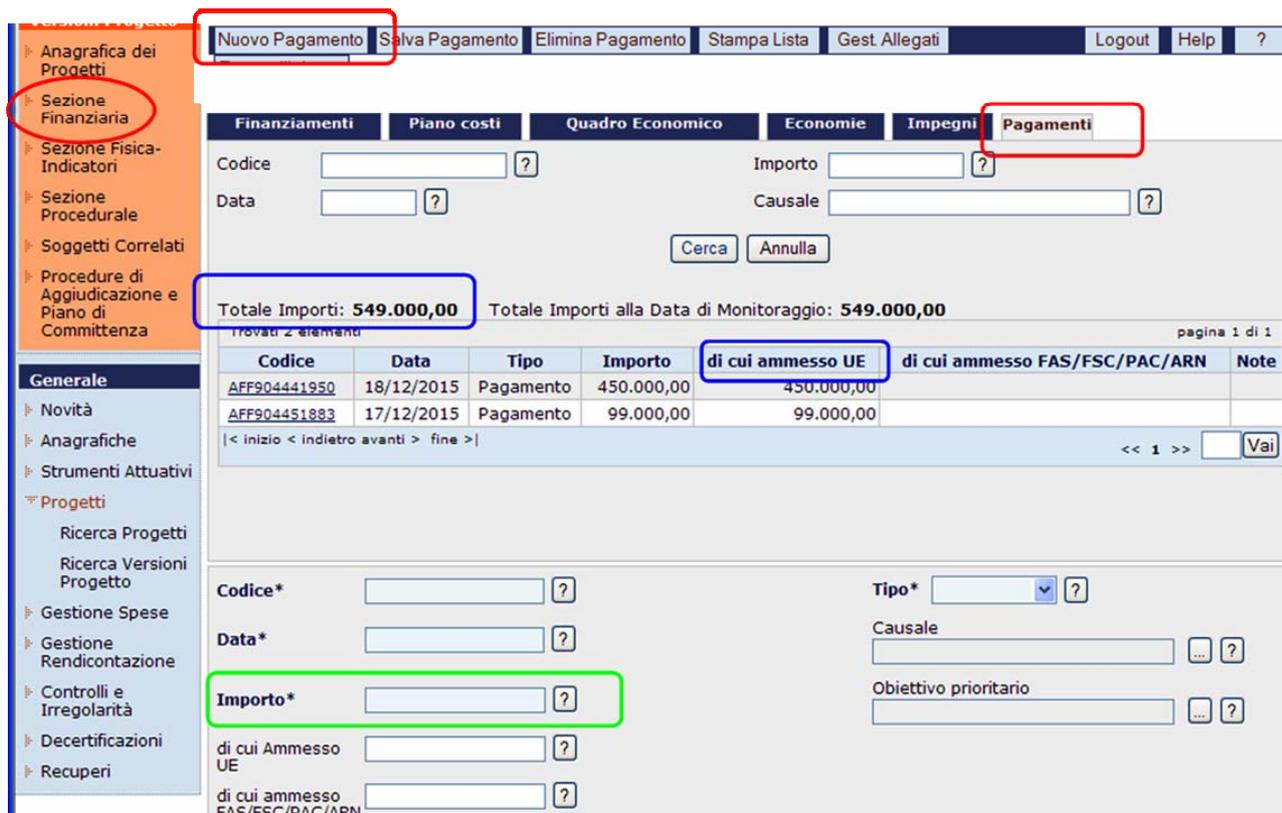

Nuovo Pagamento | Salva Pagamento | Elimina Pagamento | Stampa Lista | Gest. Allegati | Logout | Help | ?

Finanziamenti | Piano costi | Quadro Economico | Economie | Impegni | **Pagamenti**

Codice: [] ? Importo: [] ?
Data: [] ? Causale: [] ?

Cerca Annulla

Totale Importi: **549.000,00** Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **549.000,00**

Codice	Data	Tipo	Importo	di cui ammesso UE	di cui ammesso FAS/FSC/PAC/ARN	Note
AFF904441950	18/12/2015	Pagamento	450.000,00	450.000,00		
AFF904451883	17/12/2015	Pagamento	99.000,00	99.000,00		

Generale

Novità

Anagrafiche

Strumenti Attuativi

Progetti

Ricerca Progetti

Ricerca Versioni Progetto

Gestione Spese

Gestione Rendicontazione

Controlli e Irregolarità

Decertificazioni

Recuperi

Codice* [] ? Tipo* [] ?

Data* [] ? Causale [] ?

Importo* [] ? Obiettivo prioritario [] ?

di cui Ammesso UE [] ?

di cui ammesso FAS/FSC/PAC/ARN [] ?

Qualora il Beneficiario avesse già inserito pagamenti effettuati a partire dal 01/01/2016 nella colonna “di cui ammesso UE”, dovrà eliminarli e reinserirli secondo la modalità su specificata.

Sezione Finanziaria

Finanziamenti Piano costi Quadro Economico Economie Impegni **Pagamenti**

Codice ? Importo ?
Data ? Causale ?

Cerca Annulla

Totale Importi: **3.306.517,45** Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **3.062.017,80**

Trovati 107 elementi pagina 1 di 14

Codice	Data	Tipo	Importo	di cui ammesso UE	di cui ammesso FAS/FSC/PAC/ARN	Note
AFF944961079	08/03/2016	Pagamento	34.809,56	34.809,56		
AFF947491052	08/03/2016	Pagamento	1.144,00	1.144,00		
AFF947491150	08/03/2016	Pagamento	5.200,00	5.200,00		
AFF944961052	08/03/2016	Pagamento	25.447,92	25.447,92		
AFF944961081	08/03/2016	Pagamento	177.898,17	177.898,17		
AFF833991051	28/12/2015	Pagamento	18,26		18,26	
AFF833991175	28/12/2015	Pagamento	51,13		51,13	
AFF83399970	28/12/2015	Pagamento	214,83		214,83	

< inizio < indietro avanti > fine > | << 1 2 3 4 5 6 7 >> Vai

A tal fine dovrà preliminarmente “RIAPRIRE” le relative richieste nella sezione “Gestioni spese – Richieste di pagamento”.

Strumenti Attuativi

Progetti

Ricerca Progetti
Ricerca Versioni Progetto

Scarico Dati

Gestione Spese

Affidamenti

Documenti di Spesa

Richieste Pagamento

Riepilogo Contabile

Gestione Rendicontazione

Protocolli Esterni

Procedure Attivazione

Controlli e Irregolarità

Anagrafica **Dettaglio Pagamento**

TOTALI:
Importo 6.344,00 Importo Ammissibile 6.344,00 Importo Calcolato 6.344,00

Data Elaborazione* 08/03/2016 ? Numero Richiesta ?

Sistema Pagamento* IGRUE ? Tipi Fondo UE ?

Tipo Richiesta RDE ? Fondo* NAZ 100,00 Inserisci Modifica % Elimina ?

Tipo Pagamento Pagamento Intermedio ?

Annullato ?

Note

Sistema Gestione Progetti - Windows Internet Explorer

http://dpsapp.dps.gov.it/SGP/ponatas/protected/findListRichPagamenti.do?showDetallRichPagamento=OK&id=5

Sistema Gestione Progetti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

UNA PA PER LA CRESCITA

Generale

Novità

Anagrafiche

Strumenti Attuativi

Progetti

Ricerca Progetti

Nuova Richiesta

Aggiorna Anagrafica Chiusa

Riapri Richiesta Chiusa

Torna all'elenco

Logout

Help ?

Anagrafica

Dettaglio Pagamento

Quietanze

Colloquio NSF

Allega file NSF

TOTALI:
